Programa de Reconstruccion Asfalto Eje 1

Asesoria y Construcciones Doyar S.A. de C.V.

Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.

Periodo resaltado: 22

Duración del plan | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan)
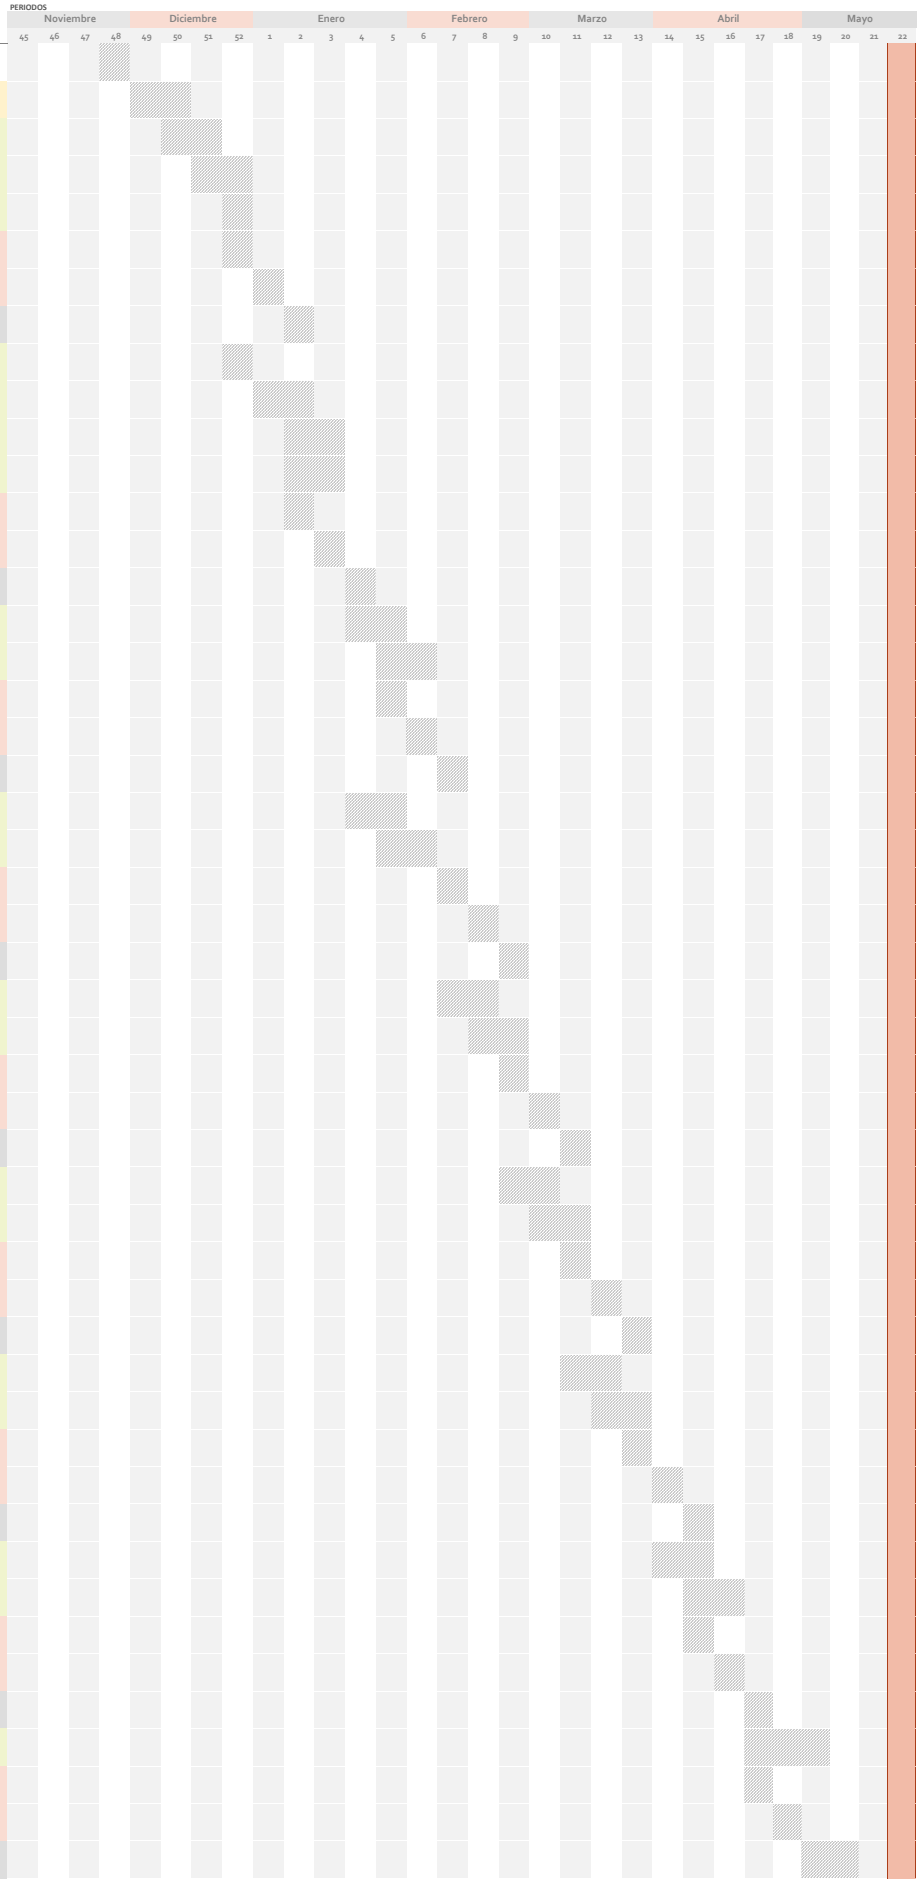
	ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO
	PRELIMINARES	48	1	0	0	0%
TERRACERIAS	FRESADO SECCION 01 Y 02	49	2	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	1/4 CRUCERO CALLE 3N	50	2	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	1/4 CRUCERO CALLE 4N	51	2	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	1/4 CRUCERO CALLE 5N	52	2	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 3N - CALLE 4N SECCION 01	52	1	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 3N - CALLE 4N SECCION 02	1	1	0	0	0%
ASFALTO	CALLE 3N - CALLE 4N SECCION 01 Y 02	2	1	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	2/4 CRUCERO CALLE 3N	52	2	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	2/4 CRUCERO CALLE 4N	1	2	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	2/4 CRUCERO CALLE 5N	2	2	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	1/4 CRUCERO CALLE 6N	2	2	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 5N - CALLE 6N SECCION 01	2	1	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 5N - CALLE 6N SECCION 02	3	1	0	0	0%
ASFALTO	CALLE 5N - CALLE 6N SECCION 01 Y 02	4	1	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	2/4 CRUCERO CALLE 6N	4	2	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	1/4 CRUCERO CALLE 7N	5	2	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 6N - CALLE 7N SECCION 01	5	1	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 6N - CALLE 7N SECCION 02	6	1	0	0	0%
ASFALTO	CALLE 6N - CALLE 7N SECCION 01 Y 02	7	1	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	2/4 CRUCERO CALLE 7N	4	2	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	3/4 CRUCERO CALLE 7N	5	2	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 7N - ACCESO 02 SECCION 01	7	1	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 7N - ACCESO 02 SECCION 02	8	1	0	0	0%
ASFALTO	CALLE 7N - ACCESO 02 SECCION 01 Y 02	9	1	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	4/4 CRUCERO CALLE 7N	7	2	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	3/4 CRUCERO CALLE 6N	8	2	0	0	0%
TERRACERIAS	ACCESO 02 - CALLE 7N SECCION 03	9	1	0	0	0%
TERRACERIAS	ACCESO 02 - CALLE 7N SECCION 04	10	1	0	0	0%
ASFALTO	CALLE 7N - ACCESO 02 SECCION 01 Y 02	11	1	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	4/4 CRUCERO CALLE 6N	9	2	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	3/4 CRUCERO CALLE 5N	10	2	0	0	0%
TERRACERIAS	ACCESO 02 - CALLE 7N SECCION 03	11	1	0	0	0%
TERRACERIAS	ACCESO 02 - CALLE 7N SECCION 04	12	1	0	0	0%
ASFALTO	ACCESO 02 - CALLE 7N SECCION 03 Y 04	13	1	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	4/4 CRUCERO CALLE 5N	11	2	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	3/4 CRUCERO CALLE 4N	12	2	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 7N - CALLE 6N SECCION 03	13	1	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 7N - CALLE 6N SECCION 04	14	1	0	0	0%
ASFALTO	CALLE 7N - CALLE 6N SECCION 03 Y 04	15	1	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	4/4 CRUCERO CALLE 4N	14	2	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	3/4 CRUCERO CALLE 3N	15	2	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 6N - CALLE 5N SECCION 03	15	1	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 6N - CALLE 5N SECCION 04	16	1	0	0	0%
ASFALTO	CALLE 6N - CALLE 5N SECCION 03 Y 04	17	1	0	0	0%
TERRACERIAS Y COLADO	4/4 CRUCERO CALLE 3N	17	3	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 4N - CALLE 3N SECCION 03	17	1	0	0	0%
TERRACERIAS	CALLE 4N - CALLE 3N SECCION 04	18	1	0	0	0%
ASFALTO	CALLE 4N - CALLE 3N SECCION 03 Y 04	19	2	0	0	0%
